
Proposta de solução:

## Esquema:

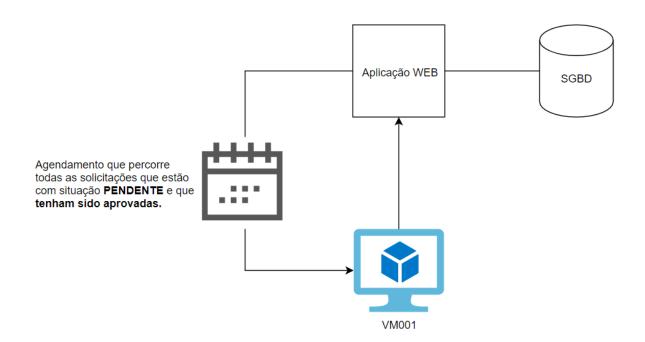

## 1. Aplicação WEB:

#### Descrição **Estimativa** É o orquestrador que faz o direcionamento Criação do mecanismo de da execução de tarefas de inclusão de autenticação, com roles: 3 dias; Existirá dois perfis: usuário usuários, inicialmente somente do Vivo360. convencional, que poderá realizar Ao cadastrar a tarefa (pedido) ela fica solicitações e um perfil de nível pendente de aprovação (aguarda o evento superior capaz de aprovar os por parte de um terceiro). Após ser pedidos, e por sua vez habilitar a aprovada, ela muda de status e então é execução; encaminhada para uma máquina que esteja disponível. Criação das migrações e seeds para armazenamento das tarefas, A máquina fará o processamento da alterações, máquinas, processos solicitação, e avisará o orquestrador se (ATRIBUTOS A DEFINIR): 1/2 dia; houve sucesso ou falha. Criação da tela de visualização dos pedidos em tabela, com filtro e paginação: 3 dias; Criação da tela de inserção de um

novo pedido, permitindo o anexo de um arquivo (opcional): 2 dias;
uiti arquivo (opoloriai). 2 dias,

# 2. Agendamento:

Descrição	Estimativa
A cada 10 segundos, seleciona todas as tarefas que estão aprovadas e aguardando execução bem como todas as máquinas disponíveis. Faz a distribuição das tarefas para as máquinas via REST.	<ul> <li>Criação do agendamento, requisição para a máquina destino: 1/2 dia;</li> </ul>

## 3. VM001:

Descrição	Estimativa
É o terminal de execução, executado em uma máquina com interface gráfica. Contém um microservidor HTTP, responsável por receber os requests do orquestrador em formato JSON.	<ul> <li>Preparação do ambiente, criação da máquina virtual, instalação do Sistema Operacional e softwares. Definir se será usado Linux ou Windows (3 dias);</li> </ul>
Ao receber o request. O mesmo é direcionado para a automação	Criação de job para deploy (1 dia);
correspondente.	<ul> <li>Implementar a lógica de recebimento de um JSON e encaminhamento</li> </ul>
A resposta é encaminha para o orquestrador via REST juntamente ao	para a automação (1 dia);
respectivo ID da tarefa.	<ul> <li>Caso seja enviado um arquivo como parte do corpo do JSON realizar a leitura (2 dias);</li> </ul>
	<ul> <li>Desenvolvimento da automação + testes práticos (4 dias);</li> </ul>
	<ul> <li>Lógica de envio do retorno de sucesso ou falha até o orquestrador (2 dias).</li> </ul>

Totalizando 22 dias. Ignorando as etapas de preparo do ambiente tem-se 18 dias de desenvolvimento.

Para desenvolvimento da PoC vejo que a parte da automação deve ser entregue em sua totalidade. Assim como o agendamento. Na implementação Web podemos simplificar o login neste primeiro momento, ou seja, criar dois usuários genéricos com os respectivos perfis. Uma parte que deixei de fora, seria o aviso automático para os envolvidos via email quando o usuário já estiver criado e acessível, contendo informações como usuário, senha e instruções para troca de senha.
